
Flujograma Gestión Lean.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN P6 EPPM



1 DEFINIR LOS USUARIOS QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO DE GESTIÓN LEAN

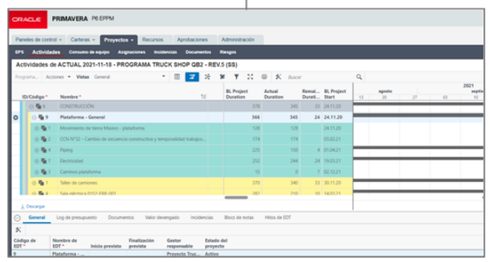


2 INTEGRACIÓN P6 EPPM – OPC LEAN


ORACLE Primavera P6 EPPM ⟷ ORACLE Primavera Cloud

3 IDENTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES AL MEDIANO PLAZO


DETALLAR LA RESTRICCIÓN | CLASIFICAR LA RESTRICCIÓN | ASIGNAR RESPONSABLE | ASIGNAR FECHAS

- ASIGNAR FAMILIA
- ASIGNAR SUBFAMILIA
- FECHA NECESARIA
  FECHA COMPOMETIDA



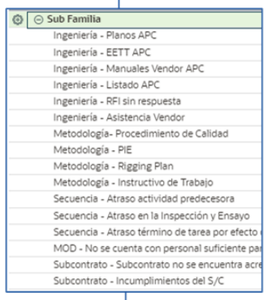

- LISTADO DE RESTRICCIONES POR GESTIONAR
- GENERAR DISCUSIONES




4 REALIZAR LA APERTURA DE ACTIVIDADES EN TAREAS

DETALLAR LA TAREA | ASIGNAR UN RESPONSABLE | ASIGNAR RELACIONES | ASIGNAR FECHAS


- DESCRIPCIÓN
- HH PROGRAMADAS
- CONTRIBUTIVA
- ID DEL ITEM
- ID DEL CWP

- TAREAS PREDECESORAS
- TAREAS SUCESORAS

- FECHA NECESARIA
- FECHA COMPOMETIDA

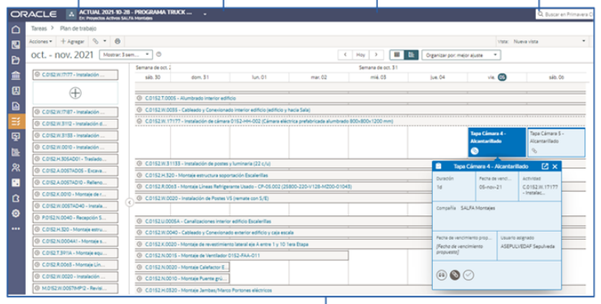

- LISTADO DE TAREAS POR REALIZAR POR ID ACTIVIDAD/ID ITEMIZADO
- PLANIFICACIÓN TRISEMANAL




5 COMPROMISO DEL RESPONSABLE DE EJECUTAR LA TAREA

6 REALIZAR ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO



7 DAR AVANCES DE LAS ACTIVIDADES EN CONCONDANCIA CON EL AVANCE DE LAS TAREAS CONTRIBUTIVAS EN OPC LEAN/TEAM MEMBER

- HH GANADAS POR TAREA
- HH GANADAS POR ACTIVIDAD
- PROGRAMA ACTUALIZADO EN OPC



ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRIMAVERA P6 EPPM
